


# Présentation du Projet d'Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN)

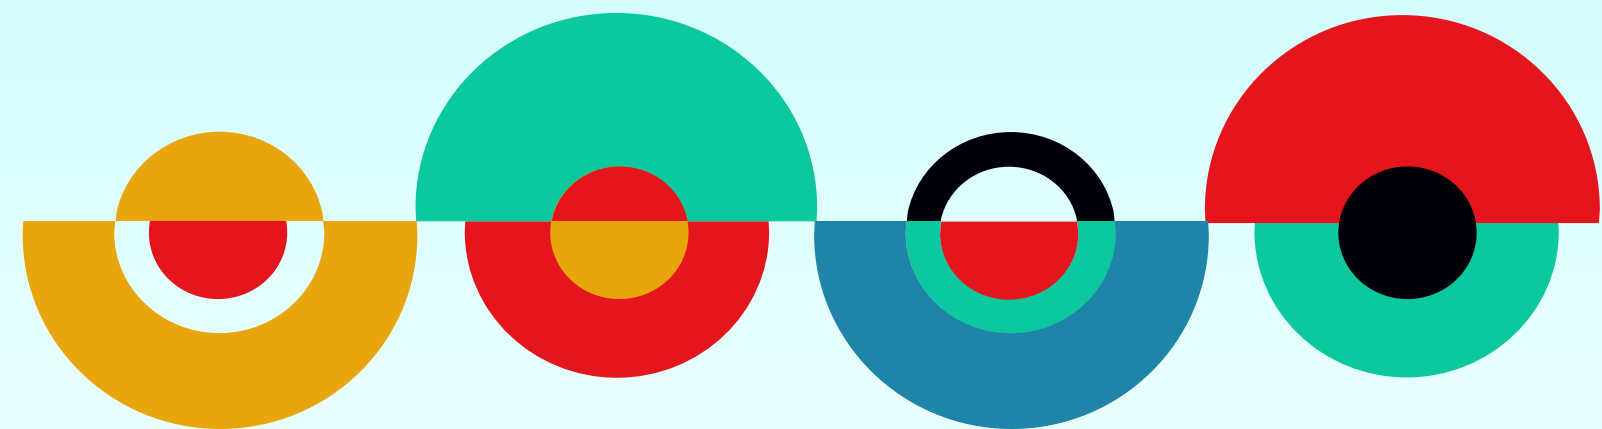

# Sommaire

**01** Revue des recommandations de la mission précédente

**02** Revue du PTBA 2025

**03** Mésures de décaissements accélérés

**04** Activités E/S

**05** Revue de la gestion financière

**06** Projet de PTBA 2026 et les Perspectives

# Revue de l'état de mise en œuvre des recommandations de la mission précédente

- Condition des décaissements : Le taux est passé de 9% au 30 juillet à 20,16% au 09 décembre 2025 ;
- Recrutement d'un cabinet sur l'audit PPA : déjà recruté et le rapport disponible ;
- Rencontres UGP/Agences d'exécution : Ces rencontres se tiennent mais elles ne sont pas régulières ;
- Réunions bimensuelles de suivi BM/UGP : Elles se tiennent même si elles sont pas régulières ;
- Recrutement du personnel complémentaire : Déjà effectif et les 2 derniers experts (AI et IN) prennent service au plus tard début janvier 2026 ;
- Archivage des dossiers dans le STEP : Le processus est en cours et le toilettage continue.

# Activités Environnementales et Sociales (E/S)

- 22 Provinces sur 23 sont couvertes par la Vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale soit un taux de réalisation de 96% ;
- 7 Provinces sur 23 couvertes par la formation, en MGP, la dotation en matériels ainsi que la sensibilisation des parties prenantes ;
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des Déchets des Équipements Électriques & Électronique (DEEE), les offres techniques sont ouvertes, l'évaluation est en cours ;
- La participation à la journée de partage d'expérience et des bases pratiques pour l'opérationnalisation du MGP ;
- Transmission à la BM le projet de MGP : Transmis à la BM depuis le 04 août 2025 ;
- Recrutement du SVBG : L'expert a déjà pris service et opérationnel ;
- Transmission du rapport E&S selon le PEES : Transmis à la BM depuis le 07 août 2025.

# Revue du PTBA 2025

- Total 134 activités inscrites dans le dernier PTBA 2025 revu dont 81 activités des sectoriels et 53 activités de l'UGP ;
- 90 activités sont exécutées ou en cours d'exécution ;
- 44 activités ne sont pas entamées pour des raisons diverses dont 8 activités annulées ;
- 6 activités reportées en 2026 ;
- Le PTBA 2025 est exécuté à 20,16% ;
- Difficultés rencontrées : retard sur la rédaction des TDR des sectoriels, équipe réduite de l'UGP, retard des dossiers sur STEP.

# Mésures de décaissements accélérés

## **Le Code des marchés publics**

Consultation  
directe

Consultation  
restreinte

Bon de  
commandes

## **Procédures de la Banque mondiale**

Consultation  
directe

Consultation  
restreinte

Cotations

# Revue de la gestion financière

## Flux des fonds

Le taux de décaissement est de **10.10%** pour l'IDA E-3740 TD selon **ClientConnection**.

Quatre (4) DRFs ont été soumises au cours de l'exercice 2025:

- DRF 03 pour un montant de **596.165.284 XAF** ( Documentation );
- DRF 04 pour un montant **488.303.749 XAF** (payée)
- DRF 05 pour un montant de **311.141.370 XAF** (payée)
- DRF 006 pour un montant de **384.677.857 XAF** en traitement au service de décaissement de la Banque depuis le 5 décembre 2025.

DRF totale : **1 780 288 260 XAF** soit **2 967 147 USD**

Enfin, la DPD 02 payée à l'UNOPS pour un montant de **630.647 USD**

## EXECUTION DU PTBA 2025


Description de Composante	Budget	Realisation	Taux d'execution
Composante 1 : Connectivité haut débit résiliente au changement climatique et inclusion numérique	9 346 350 000	958 177 733	10,25
Composante 2 : Jeter les bases clés des services gouvernementaux numériques	4 291 392 000	911 337 777	21,23%
Composante 3 : Gestion de projet et transfert des compétences	1 269 602 000	1 136 864 294	89,54%
Composante 4 : CERC	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>14 907 344 000</b>	<b>3 006 379 804</b>	<b>20,16%</b>

## **AUDIT INTERNE ET EXTERNE**

- Audit interne : L'auditeur interne du projet a été recruté, il devra prendre service au début du mois de janvier 2025.
- L'auditeur externe : l'auditeur externe a été recruté, les fonds de préparation de l'exercice 2024 ont été audités, les rapports sont disponibles à l'UGP. Ils devront être soumis avec les rapports de l'audit des états financiers 2025 du PATN à la Banque à travers ClientConnection.
- Un avenant au contrat initial a été signé avec le Cabinet pour les exercices 2025 et 2026 du PATN.

# PROJET DU PTBA 2026

- 30 462 550 240 CFA
- 50 770 917 USD

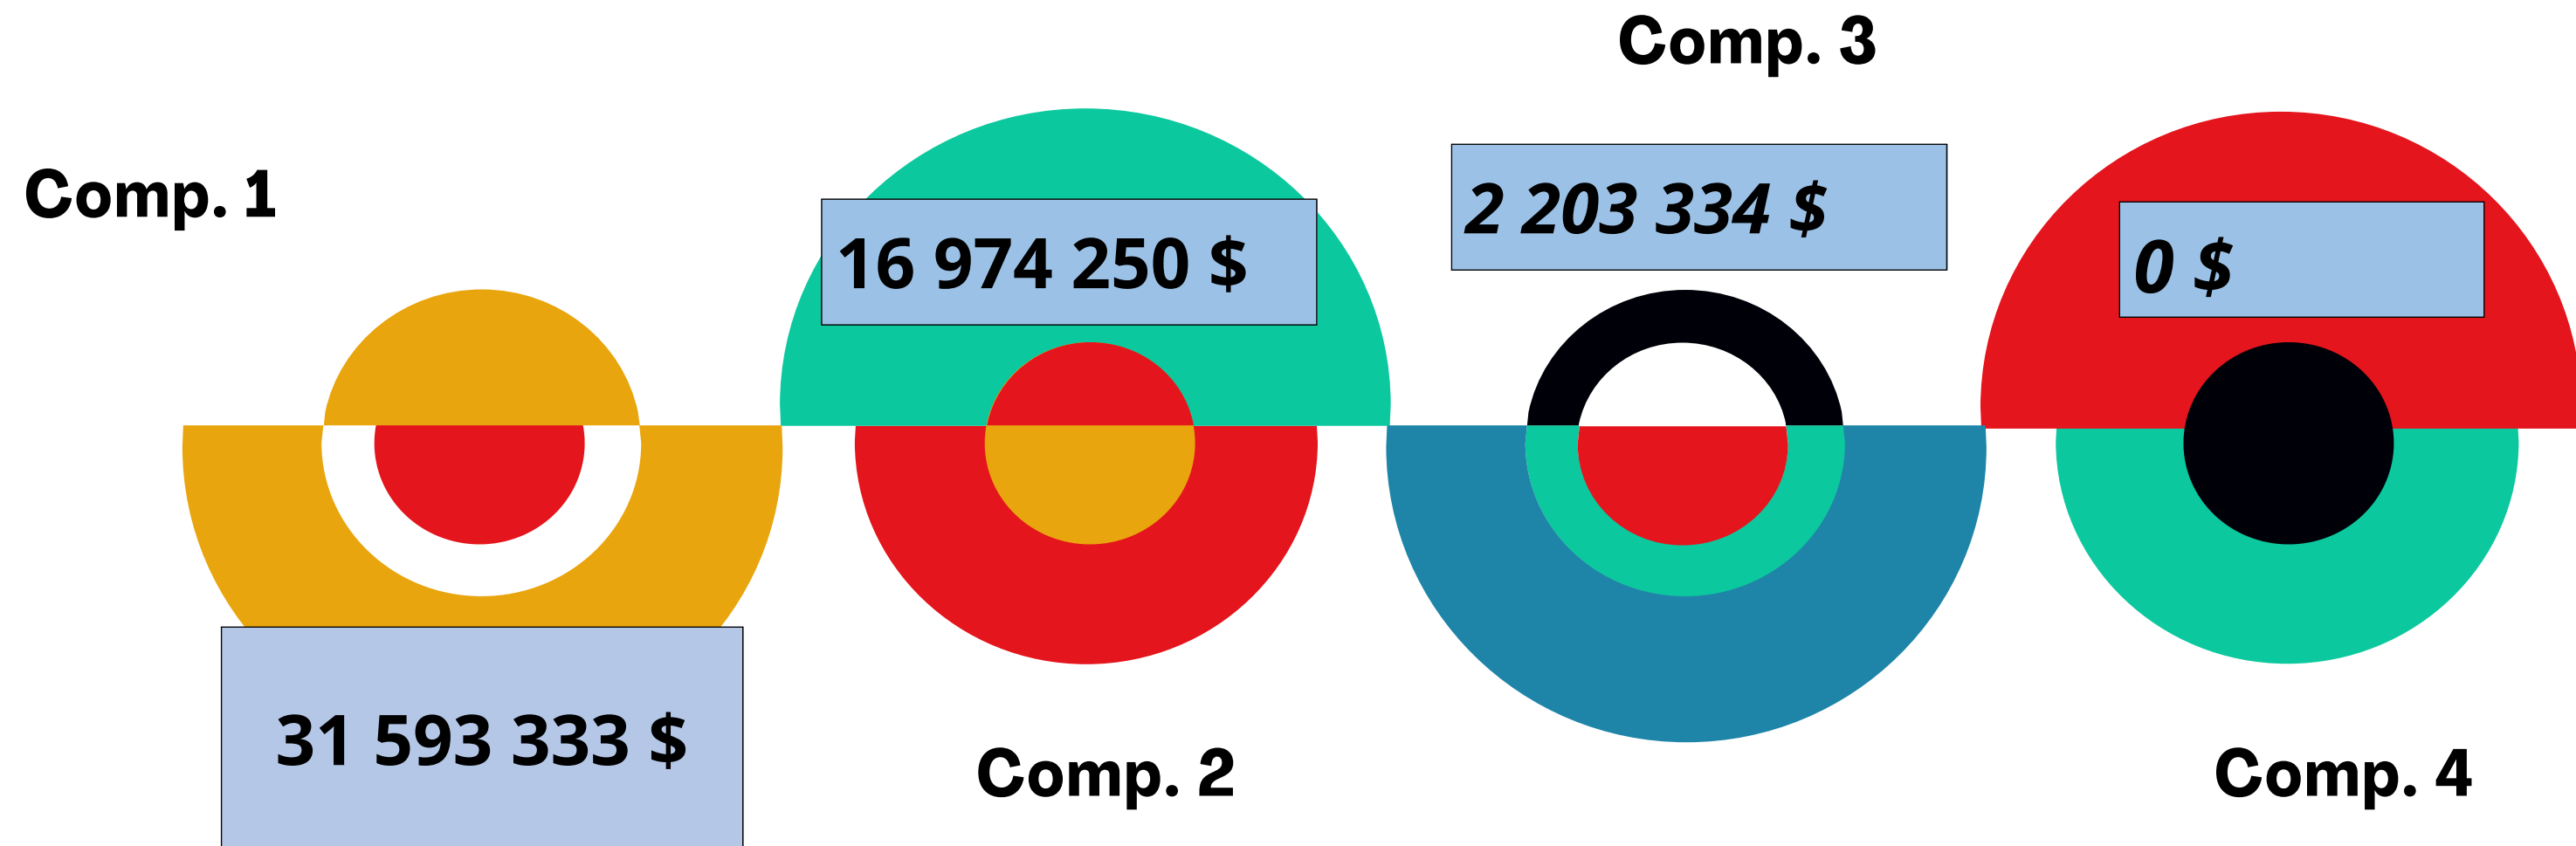

# Les perspectives

**Atelier 1** : fin Décembre organiser un atelier sur la rédaction des Termes de Références des activités du PTBA 2026

**Atelier 2** : Mi-mars 2026 organiser un atelier sur la rédaction des Termes de Références des activités du PTBA 2026

**Atelier 3** : Atelier sur la vulgarisation des documents stratégiques du projet (PAD)

**Activités E/S** : Suivi des activités du CGES par les spécialistes en sauvegarde E&S et genre

MERCI !
